

Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 967 /Registro Generale del 21/12/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 156 DEL 20/12/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE
S.ANTONIO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – CIG
8917886854 – CUP I67H20004080004.**



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO 3° SETTORE N. 156 DEL 20 Dicembre 2021

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE S. ANTONIO –
Approvazione perizia di variante e suppletiva – CIG 8917886854 - CUP: I67H20004080004**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 12/10/2021 prot. 22983 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 699 del 28/09/2021, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa "Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L.", avente sede legale in Gravina di Catania, via Gramsci n. 20/G, P. IVA 04693580872, per l'importo di € 87.862,55 (al netto del ribasso del 0,966%) di cui € 86.954,89 per lavori ed € 908,16 per oneri della sicurezza;
- il quadro economico dei lavori scaturito dalla trattativa diretta esperita sulla piattaforma del MEPA è risultato il seguente:

A) Per lavori al netto del ribasso €. **87.862,55**
di cui:

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza €. **86.954,39**

A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. €. **908,16**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 10% su "A" € **8.786,26**

C) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) € **1.774,21**

D) Per oneri di conferimento in discarica € **6.300,00**

E) Per imprevisti € **4.343,97**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. **21.204,44**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. **109.066,99**

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale del 05/10/2021 e considerato che nel capitolato speciale d'appalto è prevista una durata di giorni 45, gli stessi dovevano risultare ultimati entro la data del 19/11/2021;
- sotto la data del 25/10/2021 venne stilato un verbale di sospensione dei lavori con il quale si prese atto che le previsioni progettuali non consentivano di realizzare opere con garanzia di durabilità nel tempo per cui si rendeva necessario predisporre ed approvare una perizia di variante;
- la perizia di variante veniva immediatamente predisposta nelle ipotesi di cui al comma 1) lettere b) e c) dell'art. 106 del Codice, appurando che il rifacimento del manto stradale in tutte e 5 le

strade incluse nel progetto comportava, rispetto all'importo progettuale, uno sbordo di spesa incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio dell'ente;

- pertanto si è imposta la necessità di limitare l'importo complessivo dei lavori previsti in perizia entro il limite del 15% previsto dal comma 2 lett. b) del citato art. 106 del Codice;
- tale limitazione ha imposto la necessità di stralciare dal progetto il rifacimento del manto stradale nelle vie Gandhi e La Pira, rimandando tali realizzazioni ad altro progetto da imputare al prossimo esercizio finanziario;

CIO' PREMESSO

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva predisposta dal direttore dei lavori con la quale, al fine di garantire la durabilità delle opere, sono stati riprogettati gli interventi previsti sulle vie Crimi, Colomba e Martiri per la Libertà, escludendo dal progetto le lavorazioni originariamente previste sulle vie Gandhi e La Pira;

EVIDENZIATO il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva come segue (importo lordo dei lavori di perizia € 99.518,93 + € 908,16 = € 100.427,09):

| | | |
|--|----|-------------------|
| A) Per lavori al netto del ribasso dello 0,966% | €. | 99.465,74 |
| di cui: | | |
| A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza | €. | 98.557,58 |
| A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. | €. | 908,16 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.: | | |
| B) Per IVA al 10% su "A" | € | 9.946,57 |
| C) Incentivo ex art. 113 Codice (2% di 100.427,09) | € | 2.008,54 |
| D) Per oneri di conferimento in discarica | € | 6.300,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 18.255,11 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | €. | 117.720,85 |
| Impegno di spesa 552/2 esercizio 2021 | | 113.500,00 |
| MAGGIORE IMPORTO DA STANZIARE: | € | 4.220,85 |

PRESO ATTO che in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi durante gli scorsi mesi di Ottobre e Novembre, e nelle more dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva in trattazione, i lavori risultano ancora sospesi;

RILEVATO che in conseguenza delle varianti sopra descritte l'importo contrattuale dei lavori registra un incremento di € 11.603,19 pari al 13,206 % dell'importo iniziale, che viene reperito in parte all'interno del quadro economico di progetto, dalle voci "Imprevisti" (che viene azzerata) e dal "Ribasso di gara" mentre per € 4.220,85 occorre integrare l'impegno di spesa originario;

EVIDENZIATO che poichè il contratto dei lavori è stato stipulato "a misura", le varianti apportate hanno comportato la necessità dell'adeguamento dei rilievi laddove è risultato necessario e delle quantità delle medesime lavorazioni previste in contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

RILEVATO che il progetto scaturente dalla perizia di variante in trattazione è migliorativo rispetto a quello appaltato in quanto garantisce la durabilità delle opere in corso di realizzazione oltre al completamento della parte inferiore di via Crimi che altrimenti avrebbe continuato ad avere zone non definite, abbandonate alla vegetazione spontanea;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 poiché il maggior importo di € 4.220,85 da stanziare per l'approvazione della presente perizia viene reperito da un capitolo in precedenza assegnato dalla Giunta Comunale con la delibera di G.M. n. 13/2021, la perizia in esame può essere approvata in linea amministrativa dal coordinatore del 3° settore;

PRESO ATTO che per l'esecuzione delle variazioni dei lavori di contratto è stato necessario concedere all'impresa n. 6 giorni suppletivi per l'ultimazione dei lavori per cui resta un tempo utile residuo di 25 + 6 = 31 giorni;

VISTA la Relazione con la quale il sottoscritto RUP ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante in trattazione;

PRESO ATTO che la perizia in approvazione non richiede la previsione di alcun nuovo prezzo;

VISTO che la presente perizia è costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Planimetria, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo;

RILEVATO che sul progetto originario non era risultato necessario acquisire pareri da parte di enti diversi dal Comune di Lentini per cui anche la presente perizia segue il medesimo iter di approvazione;

Per quanto sopra esposto **SI PROPONE** al coordinatore del 3° settore di **DETERMINARE** quanto segue:

- 1) **APPROVARE** la perizia di variante tecnica e suppletiva, riguardante l'appalto dei Lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie del quartiere Sant'Antonio affidato con il contratto prot. 22983 del 12 Ottobre 2021 all'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture srl con sede in Gravina di Catania (Ct);
- 2) **CONFERMARE** il quadro economico di Perizia di Variante sopra evidenziato, dando atto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 11.603,19 e un incremento dell'importo complessivo del progetto pari ad € 4.220,85;
- 3) **STABILIRE** che la firma della presente determina da parte del coordinatore del 3° settore e del legale rappresentante dell'impresa assuma il valore di atto aggiuntivo al contratto;
- 4) **PRENDERE ATTO** che per i lavori in trattazione, con la determina RG 699 del 28/09/2021 è già stato assunto l'impegno di spesa di € 113.500,00 al capitolo 72133 impegno n. 552/2;
- 5) **IMPUTARE** la spesa suppletiva di € 4.220,85 al capitolo 28490 impegno come da modello allegato dal coordinatore del 3° settore.
- 6) **DICHIARARE:**
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
 - gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Salvatore Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;
VISTO l'OO.EE.LL. e lo statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto coordinatore.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 21/12/2021 12:34:34



CITTA' DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE SANT'ANTONIO -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

RELAZIONE DEL RUP

Lentini li _

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. S. Ridolfo

La presente Relazione viene resa prendendo a riferimento l'omologa Relazione redatta dal Direttore dei Lavori ed allegata alla perizia di variante tecnica e suppletiva. Dall'esame della perizia, si prende atto che l'importo complessivo dei lavori risulta incrementato da lavori resi necessari da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione dell'appalto (comma 2 lett. b). La maggiore spesa necessaria per l'incremento dell'importo contrattuale di € 11.603,19 viene reperita in parte dalla voce "imprevisti" del quadro economico del progetto appaltato, in parte dalle economie che risultavano disponibili in conseguenza del ribasso di gara, in parte dalla maggiore somma disponibile sull'impegno di spesa n. 552/2/2021 e per € 4.220,85 da integrare con un nuovo impegno di spesa. Con la perizia di variante è risultato necessario escludere dal progetto ogni intervento riguardante le vie Gandhi e La Pira in quanto altrimenti la perizia avrebbe sfiorato i limiti imposti dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

Detto incremento dell'importo contrattuale e la contemporanea riduzione delle vie di intervento, consentirà di realizzare una viabilità avente caratteristiche funzionali e di durabilità decisamente superiori a quelle previste nel progetto originario.

Per quanto sopra relazionato, confermando e facendo proprie le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica di Perizia, si esprime **parere tecnico favorevole** sulla perizia di variante tecnica e suppletiva in trattazione nella forma proposta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Ridolfo'. Below the signature is a circular official stamp, partially obscured by the signature. The stamp contains some text, including what looks like '2023' and some illegible characters.



CITTA' DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL
QUARTIERE SANT'ANTONIO -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

Lentini li _

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. B. Zagami

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Provinciale di Siracusa

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE S. ANTONIO – Approvazione perizia di variante e suppletiva – CIG 8917886854 - CUP: I67H20004080004

Impresa: "Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L.", avente sede legale in Gravina di Catania, via Gramsci n. 20/G, P. IVA 04693580872

Contratto perfezionato tramite sottoscrizione della Determina n. 699 del 28/09/2021 (prot. 22983 del 12/10/2021) -.

Importo contrattuale dei lavori euro 87.862,55, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

Il progetto originariamente approvato, interessava n. 5 strade ricadenti all'interno del quartiere Sant'Antonio edificato abusivamente ed in seguito soggetto sia a un Piano Particolareggiato Attuativo del PRG che a un Piano di Recupero redatto ai sensi della L.R. n. 37/1985. Il quartiere risulta a tutt'oggi in corso di completamento edificatorio mentre le opere di urbanizzazione sono state realizzate con più interventi parziali che hanno appena assicurato la vivibilità minima del comprensorio.

Le strade del quartiere Sant'Antonio vennero asfaltate alla fine degli anni '90 mediante interventi di depolverizzazione con i quali sul piano di campagna esistente venne posato uno strato di asfalto dello spessore di 5 cm circa che per oltre 20 anni ha garantito la percorribilità delle vie del comprensorio.

L'azione deteriorante degli agenti atmosferici, gli scavi eseguiti per le riparazioni delle perdite idriche e fognarie, l'usura determinata dal passaggio degli automezzi pesanti utilizzati per la realizzazione delle nuove costruzioni, hanno in pratica distrutto le sedi viarie depolverizzate, richiedendo la necessità di predisporre il progetto appaltato con il contratto prot. 22983 del 12/10/2021.

Nelle tre vie Crimi, Colomba e Martiri della Libertà, in progetto erano state previste sia superfici da recuperare con la creazione di uno strato di fondazione con misto granulometrico e successivi strati di asfalto di binder ed usura sia tratti ove attuare la sovrapposizione di nuovi strati di asfalto sull'asfalto residuo dalla depolverizzazione degli anni '90. In corso d'opera è stato accertato che stante il sottostrato argilloso al vecchio asfalto della depolverizzazione, nessuna garanzia di durabilità poteva essere attribuita agli ampi tratti in cui avrebbe dovuto operarsi la sovrapposizione del nuovo al vecchio asfalto. Pertanto non potendo rischiare un prematuro degrado della viabilità interessata dal progetto in trattazione, si è scelto di realizzare nelle tre vie Crimi, Colomba e Martiri della Libertà l'integrale realizzazione del cassonetto stradale con il misto granulometrico di cui all'art. 6.2.2 del prezzario regionale. Sulla parte bassa di via Crimi l'intervento di pavimentazione

stradale che in progetto era stato previsto in forma parziale, è stato invece operato a tappeto in modo tale da eliminare tutte le zone che altrimenti avrebbero conservato l'aspetto di campagna abbandonata alle erbacce spontanee. I lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire hanno determinato sempre per le tre vie Crimi, Colomba e Martiri della Libertà, un nuovo computo ove l'importo dei lavori ammonta a complessive € 99.465,74 (al netto del ribasso) contro gli € 87.862,55 del contratto e quindi con un aumento dell'importo dei lavori di € 11.603,19 pari al 13,206 % dell'importo iniziale; tale maggior importo viene reperito in parte all'interno del quadro economico di progetto, dalle voci "Imprevisti" (che viene azzerata), dal "Ribasso di gara", dal maggior impegno n. 552/2/2021 rispetto all'importo del progetto, mentre per € 4.220,85 occorre integrare l'impegno di spesa originario.

In definitiva per le sole tre strade predette il quadro economico di perizia diviene il seguente:

| | | |
|--|----|-------------------|
| A) Per lavori al netto del ribasso dello 0,966% di cui: | €. | 99.465,74 |
| A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza | €. | 98.557,58 |
| A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. | €. | 908,16 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.: | | |
| B) Per IVA al 10% su "A" | € | 9.946,57 |
| C) Incentivo ex art. 113 Codice (2% di 100.427,09) | € | 2.008,54 |
| D) Per oneri di conferimento in discarica | € | 6.300,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 18.255,11 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | €. | 117.720,85 |
| Impegno di spesa 552/2 esercizio 2021 | | 113.500,00 |
| MAGGIORE IMPORTO DA STANZIARE: | € | 4.220,85 |

Quanto sopra evidenziato è stato accertato in corso d'opera in quanto la pavimentazione esistente non consentiva la piena conoscenza dei luoghi e i sondaggi puntuali e i sopralluoghi eseguiti in fase progettuale non potevano risultare esaustivi.

In generale quindi, tutte le variazioni apportate ai lavori hanno consentito di conseguire sia una migliore funzionalità che la previsione di una maggiore durabilità della viabilità trattata.

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE VARIANTI

La perizia non introduce nessun nuovo prezzo per cui le varianti riguardano esclusivamente la variazione delle quantità previste in progetto; tali variazioni hanno determinato la saturazione dell'importo contrattuale nelle sole tre vie Crimi, Colomba e Martiri della Libertà, comportando un aumento dell'importo netto dei lavori per € 11.603,19.

I lavori in variante già eseguiti e quelli da eseguire competeranno alla stessa ditta affidataria sopra generalizzata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., atteso che la sostituzione della ditta risultava palesemente impraticabile per motivi tecnici ed economici e l'affidamento ad altra ditta avrebbe comportato notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre la necessità di modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; i lavori come modificati dalla perizia di variante, non alterano la natura generale del contratto e risultano al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto (comma 2 lett. b) dell'art. 106 del Codice).

Le modifiche introdotte al contratto in oggetto hanno determinato la variazione del tempo

contrattuale che è aumentato di giorni 6 per cui alla luce dei residui 19 giorni di contratto, restano ancora 25 giorni utili per la conclusione dei lavori.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente variante:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria;
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Quadro comparativo;

Il direttore dei lavori
Ing. Bruno Zagami

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT



CITTA' DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE SANT'ANTONIO -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

PLANIMETRIE

- Via Crimi;
- Via Eugenio Colomba;
- Via Martiri della Libertà.


Lentini li _

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. B. Zagami

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

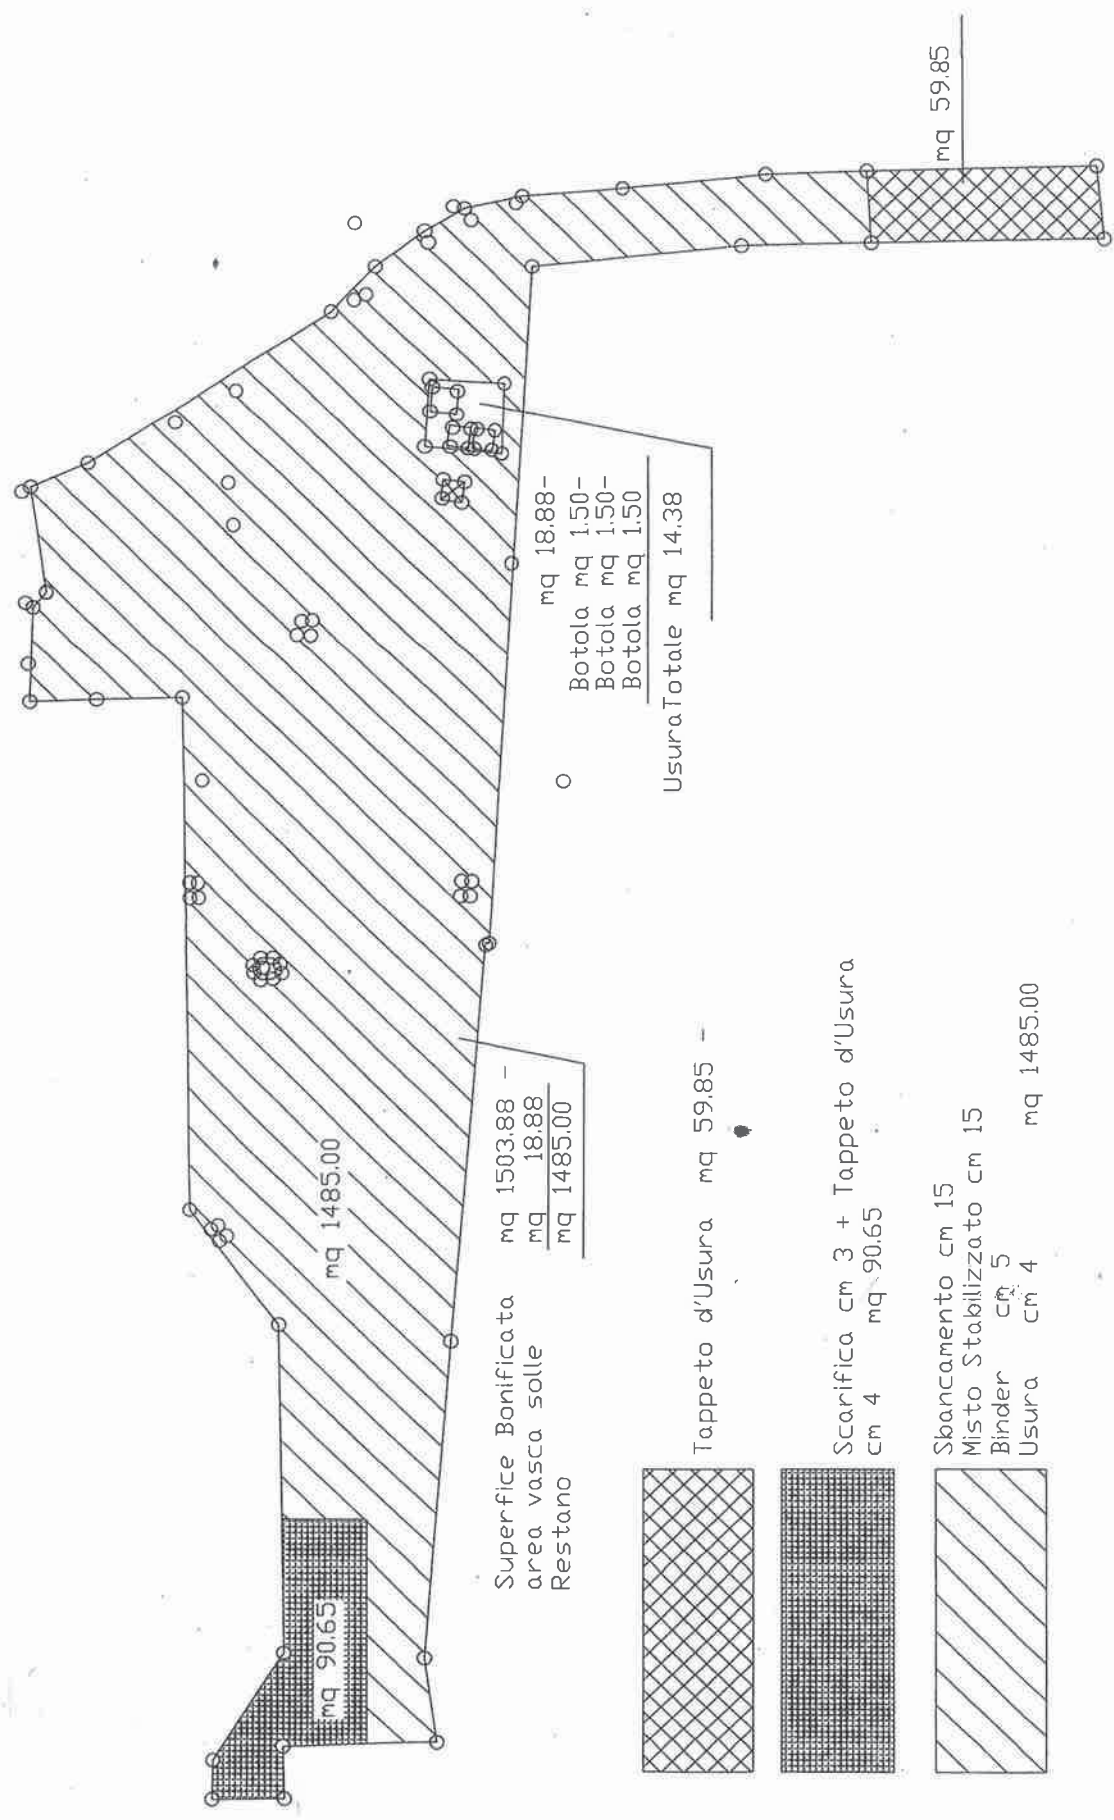



mq 18.88 -
 Botola mq 1.50 -
 Botola mq 1.50 -
 Botola mq 1.50
 Usura Totale mq 14.38

Superficie Bonificata mq 1503.88 -
 area vasca solle mq 18.88
 Restano mq 1485.00

Tappeto d'Usura mq 59.85 -


Scarifica cm 3 + Tappeto d'Usura
 cm 4 mq 90.65

Sbancamento cm 15
 Misto Stabilizzato cm 15
 Binder cm 5
 Usura cm 4 mq 1485.00




mq 59.85

VIA LIBERTA'

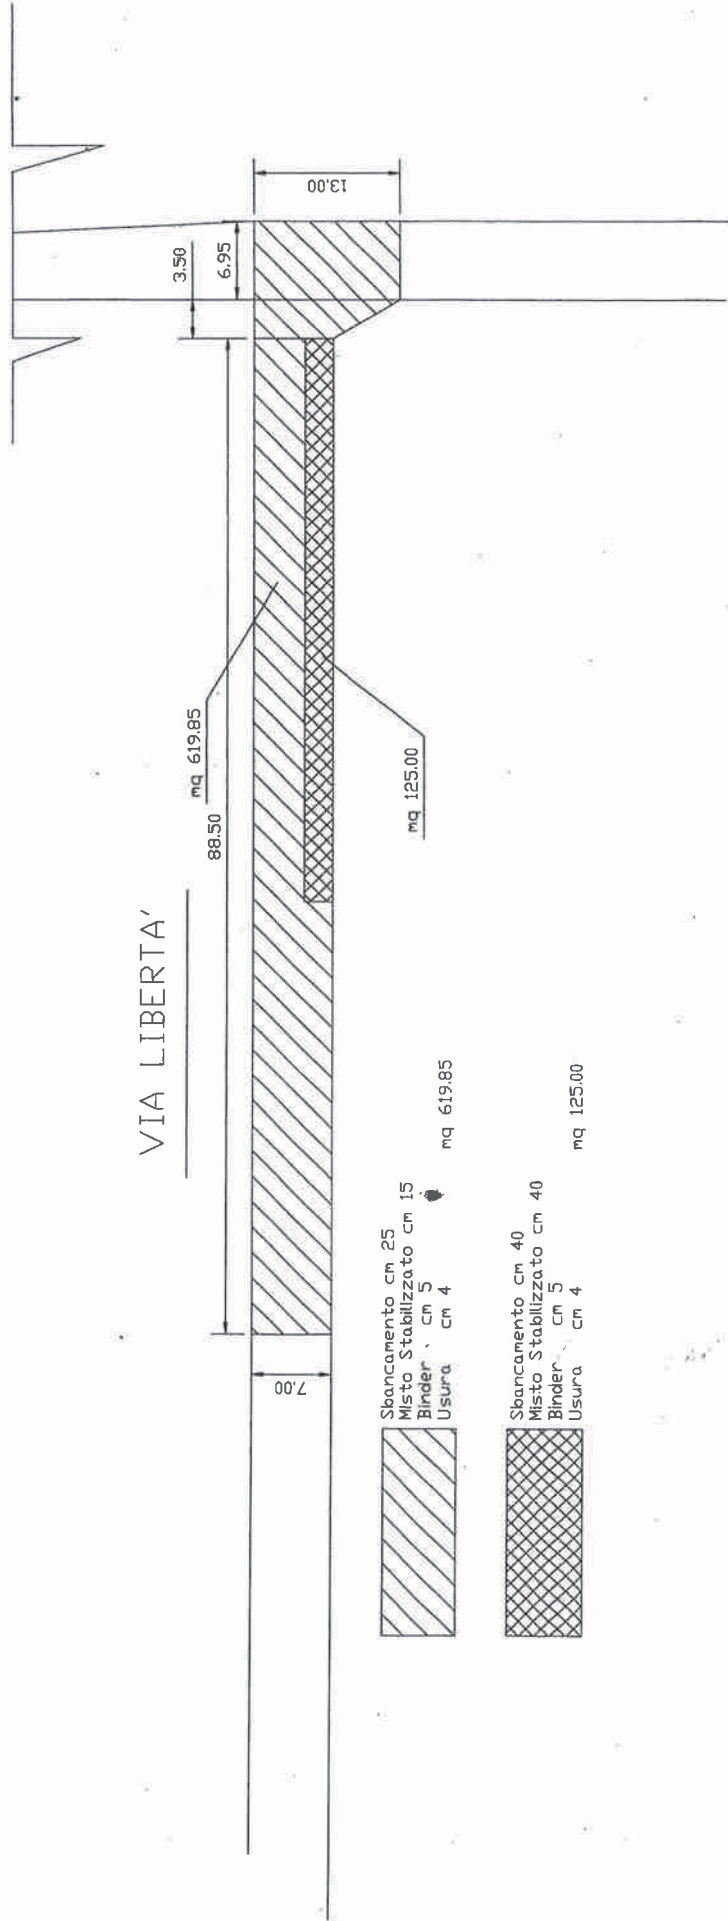

VIA COLOMBO

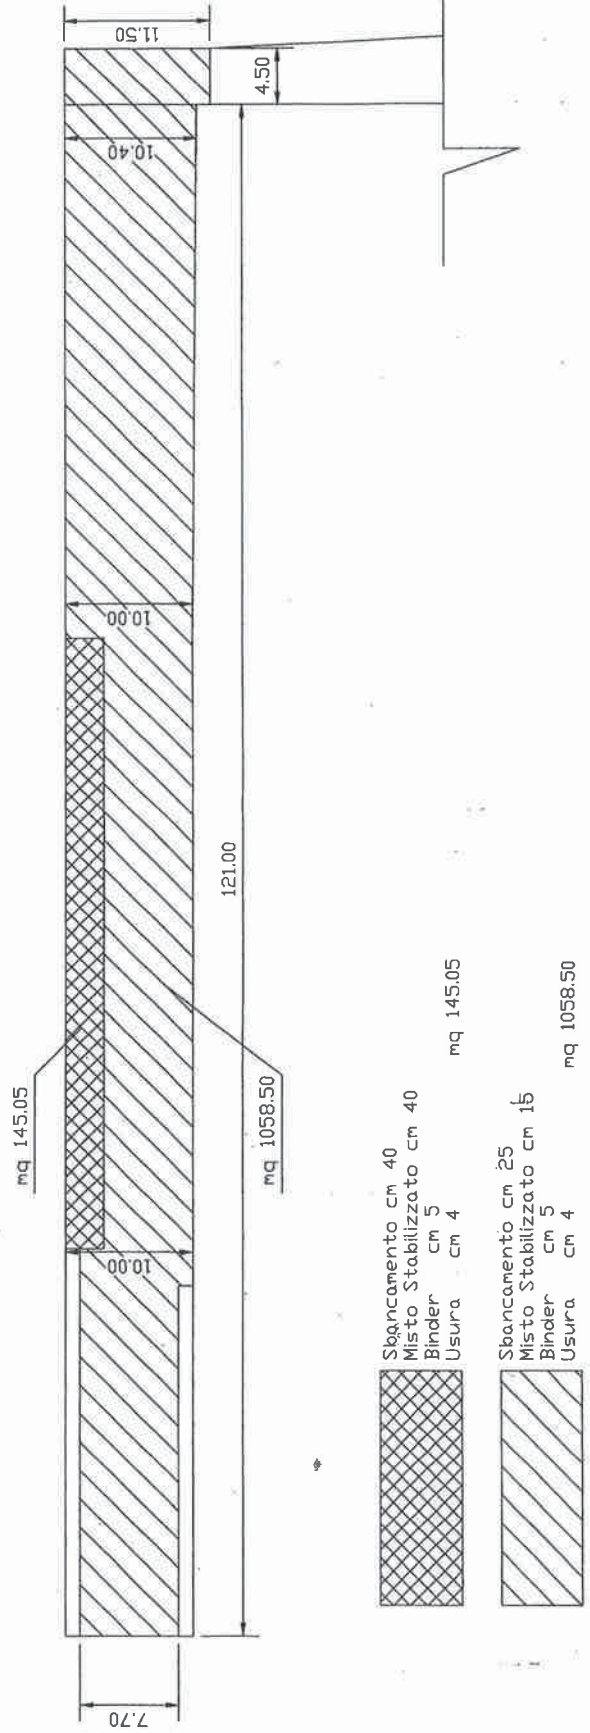

Comune di LENTINI

Provincia Siracusa

Oggetto :

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL
QUARTIERE S. ANTONIO

Stazione appaltante :

COMUNE DI LENTINI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

Il Progettista e Direttore Lavori

Ing. Bruno Zagami



| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|---|-------------------------------|--------------|-----------|
| 1 | | VIA CRIMI 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in-te | | | |
| 2 | | VIA CRIMI quantità come da disegno allegato mq 1485.00 x 0.15 SOMMANO m ³ = | 222,750 <u>222,750</u> | 4,16 | 926,64 |
| 3 | | 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su VIA CRIMI quantità come da disegno allegato mq 1485.00 SOMMANO m ² = | 1.485,000 <u>1.485,000</u> | 0,85 | 1.262,25 |
| 4 | | 1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat VIA CRIMI [vedi art. 1.1.1.1 pos.1 m ³ 222,750]x Km. 13 SOMMANO m ³ x km = | 2.895,750 <u>2.895,750</u> | 0,53 | 1.534,75 |
| 5 | | 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per VIA CRIMI quantità come da disegno allegato mq 1485.00 x 0.15 SOMMANO m ³ = | 222,750 <u>222,750</u> | 35,67 | 7.945,49 |
| 5 | | 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli VIA CRIMI quantità come da disegno allegato | | | |
| | | A RIPORTARE | | | 11.669,13 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|------------------|
| | | RIPORTO | | | 11.669,13 |
| | | mq 90.65 | 90,650 | | |
| | | SOMMANO m ² = | 90,650 | 4,29 | 388,89 |
| 6 | | 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per | | | |
| | | VIA CRIMI | | | |
| | | quantità come da disegno allegato mq 1485.00 x cm 5 | 7.425,000 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 7.425,000 | 1,76 | 13.068,00 |
| 7 | | 6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e | | | |
| | | VIA CRIMI | | | |
| | | quantità come da disegno allegato mq (1485.00+90.65+14.38+59.85) x cm 4 | 6.599,520 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 6.599,520 | 2,37 | 15.640,86 |
| 8 | | 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo | | | |
| | | n° 3 x Kg. 65.00 | 195,000 | | |
| | | SOMMANO kg = | 195,000 | 4,18 | 815,10 |
| 9 | | N.P.02 Lavori in economia per il rialzamento di chiusini in ghisa dei pozzetti d'ispezione compreso tutti i mezzi necessari (martinetto, gruppo epettrogeno ecc), e materiali necessari per portare a nuova | | | |
| | | Via CRIMI | | | |
| | | n° 3 | 3,000 | | |
| | | SOMMANO cad = | 3,000 | 197,63 | 592,89 |
| | | <i>1) Totale VIA CRIMI</i> | | | 42.174,87 |
| | | A RIPORTARE | | | 42.174,87 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|----------------------|--------------|-----------|
| | | RIPORTO | | | 42.174,87 |
| 10 | | VIA COLOMBO 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in te | | | |
| | | VIA COLOMBO quantità come da disegno allegato mq 145.05 x 0.40 mq 1058.50 x 0.25 | 58,020 264,625 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 322,645 | 4,16 | 1.342,20 |
| 11 | | 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su | | | |
| | | VIA COLOMBO quantità come da disegno allegato mq 145.05 mq 1058.50 | 145,050 1.058,500 | | |
| | | SOMMANO m² = | 1.203,550 | 0,85 | 1.023,02 |
| 12 | | 1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat | | | |
| | | VIA COLOMBO [vedi art. 1.1.1.1 pos.10 m³ 322,645]x Km. 13 | 4.194,385 | | |
| | | SOMMANO m³ x km = | 4.194,385 | 0,53 | 2.223,02 |
| 13 | | 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per | | | |
| | | VIA COLOMBO quantità come da disegno allegato mq 145.05 x 0.40 mq 1058.50 x 0.15 | 58,020 158,775 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 216,795 | 35,67 | 7.733,08 |
| 14 | | 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito | | | |
| | | A RIPORTARE | | | 54.496,19 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|---|-----------|--------------|------------------|
| | | RIPORTO | | | 54.496,19 |
| | | per | | | |
| | | VIA COLOMBO | | | |
| | | quantità come da disegno allegato | | | |
| | | mq 145.05 x cm 5 | 725,250 | | |
| | | mq 1058.50 x cm 5 | 5.292,500 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 6.017,750 | 1,76 | 10.591,24 |
| 15 | | 6.1.6.2 | | | |
| | | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e | | | |
| | | VIA COLOMBO | | | |
| | | quantità come da disegno allegato | | | |
| | | mq (145.05+1058.50) x cm 4 | 4.814,200 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 4.814,200 | 2,37 | 11.409,65 |
| | | <i>2) Totale VIA COLOMBO</i> | | | 34.322,21 |
| | | A RIPORTARE | | | 76.497,08 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|---|--|--------------|-----------|
| | | RIPORTO | | | 76.497,08 |
| 16 | | VIA LIBERTA' 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in te VIA LIBERTA' quantità come da disegno allegato mq 125.00 x 0.40 mq 619.85 x 0.25 | 50,000 154,963 SOMMANO m ³ = 204,963 | 4,16 | 852,65 |
| 17 | | 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su VIA LIBERTA' quantità come da disegno allegato mq 125.00 mq 619.85 | 125,000 619,850 SOMMANO m ² = 744,850 | 0,85 | 633,12 |
| 18 | | 1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat | | | |
| 19 | | VIA LIBERTA' quantità come da disegno allegato [vedi art. 1.1.1.1 pos.16 m ³ 204,963] x Km. 13 SOMMANO m ³ x km = | 2.664,519 2.664,519 | 0,53 | 1.412,20 |
| 20 | | 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per VIA LIBERTA' quantità come da disegno allegato mq 125.00 x 0.40 mq 619.85 x 0.15 | 50,000 92,978 SOMMANO m ³ = 142,978 | 35,67 | 5.100,03 |
| | | A RIPORTARE | | | 84.495,08 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|---|-----------|--------------|------------|
| | | RIPORTO | | | 84.495,08 |
| | | categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per | | | |
| | | VIA LIBERTA' | | | |
| | | quantità come da disegno allegato | | | |
| | | mq 125.00 x cm 5 | 625,000 | | |
| | | mq 619.85 x cm 5 | 3.099,250 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 3.724,250 | 1,76 | 6.554,68 |
| 21 | | 6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e | | | |
| | | VIA LIBERTA' | | | |
| | | quantità come da disegno allegato | | | |
| | | mq 125.00 x cm 4 | 500,000 | | |
| | | mq 619.85 x cm 4 | 2.479,400 | | |
| | | SOMMANO m ² /cm = | 2.979,400 | 2,37 | 7.061,18 |
| 22 | | 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo | | | |
| | | n° 3 x Kg. 65.00 | 195,000 | | |
| | | SOMMANO kg = | 195,000 | 4,18 | 815,10 |
| 23 | | N.P.02 Lavori in economia per il rialzamento di chiusini in ghisa dei pozzetti d'ispezione compreso tutti i mezzi necessari (martelletto, gruppo epetrogeno ecc), e materiali necessari per portare a nuova | | | |
| | | Via LIBERTA' | | | |
| | | n° 3 | 3,000 | | |
| | | SOMMANO cad = | 3,000 | 197,63 | 592,89 |
| 24 | | ONERI SICUREZZA 26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in | | | |
| | | m ² = | 24,000 | 14,03 | 336,72 |
| 25 | | 26.1.34 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare | | | |
| | | cad = | 4,000 | 40,87 | 163,48 |
| | | A RIPORTARE | | | 100.019,13 |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|-------------------|
| | | RIPORTO | | | 100.019,13 |
| 26 | | 26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono cad = | 30,000 | 1,18 | 35,40 |
| 27 | | 26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora cad = | 4,000 | 57,11 | 228,44 |
| 28 | | 26.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora cad = | 2,000 | 72,06 | 144,12 |
| | | <i>2) Totale ONERI SICUREZZA</i> | | | <i>908,16</i> |
| | | <i>3) Totale VIA LIBERTA'</i> | | | <i>23.930,01</i> |
| | | A RIPORTARE | | | 100.427,09 |

| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|--|----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| VIA CRIMI | 1 | | | 42.174,87 |
| VIA COLOMBO | 3 | | | 34.322,21 |
| VIA LIBERTA' | 5 | | | 23.930,01 |
| ONERI SICUREZZA | 6 | 908,16 | | |
| Sommano i lavori | | | | € 100.427,09 |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,904298% sui lavori) | | | 908,16 | |
| a detrarre | | | 908,16 | € 908,16 |
| Per ribasso d'asta del 0,966% su euro 99.518,93 | | | | |
| Importo complessivo dei lavori al netto | | | | € 99.465,74 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | |
| IVA su lavori al Netto aliquota 10% [99465,74X10%] | | | 9.946,57 | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) | | | | |
| [100427,09X2%] | | | 2.008,54 | |
| Oneri di conferimento a discarica | | | 6.300,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | 18.255,11 | € 18.255,11 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | | € 117.720,85 |

LENTINI li 15/12/2021

Il Progettista e Direttore Lavori

Ing. Bruno Zagami

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT



Comune di LENTINI

Provincia

Siracusa

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL
QUARTIERE S. ANTONIO

COMMITTENTE

COMUNE DI LENTINI


Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

Il Progettista e Direttore Lavori

Ing. Bruno Zagami



| Pag.1 | | | | | Progetto Originario | | Perizia N°1 | | DISCOSTAMENTI | |
|-------------|---------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Quantita' (b) | Importo (c) | Quantita' (d) | Importo (e) | IMPORTI | |
| | | | | | | | | | IN PIU' (c-c) | IN MENO (c-c) |
| 1 | | 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in tc | m³ | 4,16 | 221,940 | 923,27 | 750,358 | 3.121,49 | 2.198,22 | |
| 2 | | 1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in | m³ | 10,52 | 41,960 | 441,42 | | | | 441,42 |
| 3 | | 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidita' ottima fino al raggiungimento su | m² | 0,85 | 1.280,320 | 1.088,27 | 3.433,400 | 2.918,39 | 1.830,12 | |
| 4 | | 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per | m³ | 35,67 | 285,330 | 10.177,72 | 582,523 | 20.778,60 | 10.600,88 | |
| 5 | | 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli | m² | 4,29 | 84.000 | 360,36 | 90.650 | 388,89 | 28,53 | |
| 6 | | N.P.02 Lavori in economia per il rialzamento di chiusini in ghisa dei pozzetti d'ispezione compreso tutti i mezzi necessari (martelletto, gruppo petrogeno ecc), e materiali necessari per portare a nuova | cad | 197,63 | 21,000 | 4.150,23 | 6,000 | 1.185,78 | | 2.964,45 |
| 7 | | 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo | kg | 4,18 | 300,000 | 1.254,00 | 390,000 | 1.630,20 | 376,20 | |
| 8 | | 1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo permat | m³ x km | 0,53 | 3.166,800 | 1.678,40 | 9.754,654 | 5.169,97 | 3.491,57 | |
| 9 | | N.P.01 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso perstrato di collegamento, ecc. | | | | 20.073,67 | | 35.193,32 | 18.525,52 | 3.405,87 |
| A RIPORTARE | | | | | | | | | | |

| Pag.2 | | | | | Progetto Originario | | Perizia N°1 | | DISCOSTAMENTI | |
|--------|---------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Quantita' (b) | Importo (c) | Quantita' (d) | Importo (e) | IMPORTI | |
| | | | | | | | | | IN PIU' (e-c) | IN MENO (c-e) |
| | | RIPORTO | | | | 20.073,67 | | 35.193,32 | 18.525,52 | 3.405,87 |
| | | | mc | 175,84 | 29,000 | 5.099,36 | | | | 5.099,36 |
| 10 | | 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per | m²/cm | 1,76 | 7.591,600 | 13.361,22 | 17.167,000 | 30.213,92 | 16.852,70 | |
| 11 | | 6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e | m²/cm | 2,37 | 17.438,440 | 41.329,10 | 14.393,120 | 34.111,69 | | 7.217,41 |
| 12 | | NOLO 1 Noleggio di pala meccanica compreso conducente, carburante, assicurazione, ecc. | h | 80,00 | 24,000 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 |
| 13 | | OP.01 Operaio Comune | h | 23,41 | 24,000 | 561,84 | | | | 561,84 |
| 14 | | 13.3.16.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli | m | 6,15 | 221,000 | 1.359,15 | | | | 1.359,15 |
| 15 | | N.P.03 Realizzazione o sostituzione di condotta di allaccio dal contatore di misurazione alla condotta di distribuzione per una lunghezza totale complessiva fino a ml.5,00 con tubazione HD per uso potabile | cad | 227,68 | 18,000 | 4.098,24 | | | | 4.098,24 |
| 16 | | 26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in | m² | 14,03 | 24,000 | 336,72 | 24,000 | 336,72 | | |
| 17 | | 26.1.34 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare | cad | 40,87 | 4,000 | 163,48 | 4,000 | 163,48 | | |
| 18 | | 26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono | cad | 1,18 | 30,000 | 35,40 | 30,000 | 35,40 | | |
| 19 | | 26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma | | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 88.338,18 | | 100.054,53 | 35.378,22 | 23.661,87 |

| | | | | | Progetto Originario | | Perizia N°1 | | DISCOSTAMENTI | |
|--------|----------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Quantita' (b) | Importo (c) | Quantita' (d) | Importo (e) | IMPORTI | |
| | | | | | | | | | IN PIU' (c-c) | IN MENO (c-e) |
| | | RIPORTO | | | | 88.338,18 | | 100.054,53 | 35.378,22 | 23.661,87 |
| | | triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora | cad | 57,11 | 4,000 | 228,44 | 4,000 | 228,44 | ===== | ===== |
| 20 | 26.3.1.3 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora | cad | 72,06 | 2,000 | 144,12 | 2,000 | 144,12 | ===== | ===== |
| | | A RIPORTARE | | | | 88.710,74 | | 100.427,09 | 35.378,22 | 23.661,87 |

| | Progetto Originario | Perizia N°1 | DISCOSTAMENTI | |
|--|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | + | - |
| SOMMANO I LAVORI PER RIBASSO D'ASTA DEL 0,966% | 88.710,74 | 100.427,09 | 35.378,22 | 23.661,87 |
| RESTANO I LAVORI AL NETTO | 88.710,74 | 99.465,74 | | |
| RIEPILOGO | Progetto Originario | Perizia N°1 | | |
| A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali | | 88.710,74 | | 99.465,74 |
| B) Somme a disposizione amministrazione Importo IVA aliquota 10% su € 88.710,74 | 8.871,07 | | 9.946,57 | |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) | 1.774,21 | | 2.008,54 | |
| Oneri di accesso in discarica | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| Imprevisti | 4.343,98 | | | |
| Totale somme a disposizione amministrazione | 21.289,26 | 21.289,26 | 18.255,11 | 18.255,11 |
| TOTALE PERIZIA A + B | | 110.000,00 | | 117.720,85 |
| QUADRO DI CONFRONTO | | | | |
| Importo nettolavori+sicurezza Perizia N°1 | 99.465,74 | | | |
| Importo CONTRATTO N 22983/2021 | 87.862,55 | | | |
| MAGGIORI LAVORI AL LORDO | 11.603,19 | | | |
| Importo totale Perizia N°1 | 117.720,85 | | | |
| Importo totale Progetto Originario | 110.000,00 | | | |
| MAGGIORE IMPORTO | 7.720,85 | +7,02% | | |

LENTINI li 15/12/2021

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

IL PROGETTISTA
Ing. Bruno Zagami





21/12/2021

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Page 1 of 1

Attestazione n° 723

Impegno: 2021/1/816/1 del 21/12/2021**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 156 del 20/12/2021

Codice CIG:**Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 4.220,85**Oggetto:** Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie del quartiere S. Antonio approvazione perizia di variante e suppletiva.

Castelletto disponibilità al 21/12/2021

| Anno | Capitolo | Art. | Cod. bilancio | Descrizione |
|------------------|----------------|--|---------------|--|
| 2021 | 28490 | 0 | 0904103 | Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |
| Programma | 04 | Servizio idrico integrato | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| Macroagg. | 03 | Acquisto di beni e servizi | | |
| PDC | 1.03.02.15.013 | | | |

Dati Capitolo

| Stanziamiento iniziale | Variazione (+) | Variazione (-) | Assestato |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Impegni prenotati | Impegni definitivi | Presente impegno | Disponibilità |
| 0,00 | 96.882,60 | 4.220,85 | 3.117,40 |

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

Prot.n.1058 del 21/12/2021

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 21/12/2021 12:33:28

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 21 DIC 2021

Al 05 GEN 2022

col n. 1969

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 21 DIC 2021

Al 05 GEN 2022

al n _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
